



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –**  
**МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»**  
**(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)**

**Институт экономики и управления АПК**  
**Кафедра управления**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**И.о. директора**  
**Института агробизнеса**  
**А. В. Шитикова, д.с.-х.н., профессор**

“ 29 ” августа 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ**

**для подготовки магистров**

**ФГОС ВО**

**Направление: 35.04.04 – «Агрономия»**

**Направленность: Управление агробизнесом в растениеводстве**

**Курс   2**

**Семестр   3**

**Форма обучения: очная**

**Год начала подготовки: 2025**

**Москва, 2025**

Разработчики: Чекмарева Н.В., к.э.н., доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

«26» августа 2025 г.

Рецензент: Ашмарина Т.И., к.э.н.



(подпись)

«26» августа 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», профессиональных стандартов и учебного плана 2025 года начала подготовки.

Программа обсуждена на заседании кафедры управления  
протокол № 1 от «26» августа 2025 г.

Зав. кафедрой управления Кошелев В.М., д.э.н., профессор

«26» августа 2025 г.

**Согласовано:**

Председатель учебно-методической комиссии  
протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Заведующий выпускающей кафедрой  
растениеводства и луговых систем

«29» 08 2025 г.

Заведующий отделом комплектования ЦНБ

## Содержание

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АННОТАЦИЯ.....</b>                                                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ .....</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                   | <b>5</b>  |
| 4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ .....                                                                                      | 5         |
| ПО СЕМЕСТРАМ .....                                                                                                                                  | 5         |
| 4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....                                                                                                                      | 9         |
| 4.3 ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....                                                                                                              | 10        |
| 4.4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....                                                                                | 11        |
| <b>5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....</b>                                                                                                          | <b>12</b> |
| <b>6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                              | <b>12</b> |
| 6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....               | 12        |
| 6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .....                                                         | 15        |
| <b>7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>                                                                          | <b>16</b> |
| 7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА .....                                                                                                                       | 16        |
| 7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....                                                                                                                  | 16        |
| 7.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ .....                                                                                                                 | 17        |
| <b>8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>                            | <b>17</b> |
| <b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....</b>                                                                 | <b>17</b> |
| <b>10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....</b>                        | <b>18</b> |
| <b>11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>                                                                          | <b>19</b> |
| Виды и формы отработки пропущенных занятий .....                                                                                                    | 20        |
| <b>12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....</b>                                                      | <b>20</b> |

## **Аннотация**

### **рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 – Агрономия, направленности «Управление агробизнесом в растениеводстве»**

**Цель освоения дисциплины:** является приобретение теоретических знаний и освоение практических навыков в сфере управления проектами, связанными производством и реализацией продукции АПК.

**Место дисциплины в учебном плане:** дисциплина включена в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.

**Требования к результатам освоения дисциплины:** в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1); ПКос-1 (ПКос-1.3); ПКос-7 (ПКос-7.1); ПКос-9 (ПКос-9.2; ПКос-9.3); ПКос-10 (ПКос-10.1; ПКос-10.2; ПКос-10.3); ПКос-11 (ПКос-11.2.).

**Краткое содержание дисциплины:** Концепция проектного цикла. Офис проекта. Команда проекта. Планирование и управление работами по проекту. Торги и контракты. Управление изменениями. Управление стоимостью. Контроль и регулирование. Управление рисками проектов.

**Общая трудоемкость дисциплины:** 180 час. (5 зач. ед.)

**Промежуточный контроль:** экзамен.

## **1. Цели освоения дисциплины**

**Цель освоения дисциплины:** является приобретение теоретических знаний и освоение практических навыков в сфере управления проектами, связанными производством и реализацией продукции АПК.

## **2. Место дисциплины в учебном процессе**

Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» включена в перечень дисциплин вариативной части учебного плана. Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.04.04 Агрономия, профессиональных стандартов и учебного плана 2025 года начала подготовки.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» являются: «Управление в отраслях и на предприятиях АПК», «Разработка и принятие управленческих решений в растениеводстве».

Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» является основополагающей для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

### **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций, представленных в таблице 1.

## **4. Структура и содержание дисциплины**

### **4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их распределение по видам работ и семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 1

## Требования к результатам освоения учебной дисциплины

| № п/п | Код компетенции | Содержание компетенции (или её части)                                                                                                                                       | Индикаторы компетенций                                                                                                                                                                                                                                     | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:                                       |                                                                                                               |                                                                                                            |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | знать                                                                                              | уметь                                                                                                         | владеть                                                                                                    |
| 1.    | УК-2            | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла                                                                                                             | УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения | основные этапы жизненного цикла проекта, цель, задачи и критерии оценки проектов в растениеводстве | выбирать методы исследования, необходимые для решения конкретных задач управления проектами в растениеводстве | методиками анализа, необходимых при разработке, оценке и управлении реализацией проектов в растениеводстве |
| 2.    | ПКос-1          | Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области агрономии                        | ПКос-1.3. Проводит обобщение отечественного и зарубежного опыта по инновационным технологиям в области растениеводства                                                                                                                                     | особенности оценки инновационных проектов                                                          | отражать особенности инновационных проектов в математической модели проекта                                   | методикой оценки проектов в растениеводстве с использованием инноваций                                     |
| 3.    | ПКос-7          | Способен подготовить заключения о целесообразности внедрения в производство исследованных приемов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на основе анализа опытных | ПКос-7.1 Владеет методами экономической оценки технологий производства продукции растениеводства                                                                                                                                                           | основные показатели эффективности и реализуемости проектов в растениеводстве                       | применять систему показателей эффективности и реализуемости проектов в растениеводстве                        | методикой оценки инвестиционных проектов в растениеводстве                                                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | данных                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| 4. | ПКос-9  | Способен разрабатывать и реализовывать экологически безопасные приемы и технологии производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности | ПКос-9.2. Демонстрирует знания нормативных требований к качеству растениеводческой продукции                                                                                            | требования к качеству растениеводческой продукции                                                        | учитывать особенности отрасли растениеводства при разработке проектов                                                        | методикой разработки проектов с учетом особенностей отрасли растениеводства                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            | ПКос-9.3. Реализует экологически безопасные приемы и технологии производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности | принципы оценки эффективности проектов в растениеводстве                                                 | проводить оценку экономической эффективности применения технологий производства высококачественной продукции растениеводства | методами оценки экономической эффективности применения технологий производства высококачественной продукции растениеводства |
| 5. | ПКос-10 | Способен определить объемы производства отдельных видов растениеводческой продукции исходя из потребностей рынка                                                                                           | ПКос-10.1. Осуществляет сбор данных о потребностях рынка в различных видах растениеводческой продукции                                                                                  | основные каналы реализации продукции растениеводства                                                     | анализировать динамику объемов производства и потребления различных видов продукции растениеводства                          | методами планирования объемов производства различных видов продукции растениеводства                                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            | ПКос-10.2. Рассчитывает экономическую эффективность производства различных видов растениеводческой продукции                                                                            | основные показатели экономической эффективности производства различных видов растениеводческой продукции | проводить анализ экономической эффективности производства различных видов растениеводческой продукции                        | методикой оценки экономической эффективности производства различных видов растениеводческой продукции                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            | ПКос-10.3. Осуществляет планирование объемов производства продукции растениеводства на                                                                                                  | источники информации для оценки потребностей рынка в продукции растениеводства                           | планировать оптимальный объем производства продукции растениеводства с учетом потребностей рынка                             | методами планирования объемов производства различных видов продукции растениеводства с учетом по-                           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       | основе ресурсосбережения и потребностей рынка                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                    | требностей рынка                                                                                                                                                                                                |
| 6. | ПКос-11 | Способен определить направления совершенствования и повышения эффективности технологий выращивания продукции растениеводства на основе научных достижений, передового опыта отечественных и зарубежных производителей | ПКос-11.2. Определяет перспективные направления совершенствования и повышения эффективности технологий производства продукции растениеводства с учетом потребностей рынка и изменений климата | основные направления совершенствования и повышения эффективности технологий производства продукции растениеводства | определяет перспективные направления совершенствования и повышения эффективности технологий производства продукции растениеводства | методикой оценки эффективности применения современных направлений совершенствования и повышения эффективности технологий производства продукции растениеводства с учетом потребностей рынка и изменений климата |

Таблица 2

**Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам**

| Вид учебной работы                                                                                                                                                                          | Трудоёмкость в 3 семестре, час., всего/* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану                                                                                                                                      | <b>180</b>                               |
| <b>1. Контактная работа:</b>                                                                                                                                                                | <b>26,4/4</b>                            |
| <b>Аудиторная работа</b>                                                                                                                                                                    | <b>26,4/4</b>                            |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                         |                                          |
| <i>лекции (Л)</i>                                                                                                                                                                           | 8                                        |
| <i>практические занятия (ПЗ)</i>                                                                                                                                                            | 16/4                                     |
| <i>консультации перед экзаменом</i>                                                                                                                                                         | 2                                        |
| <i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>                                                                                                                                    | 0,4                                      |
| <b>2. Самостоятельная работа (СРС)</b>                                                                                                                                                      | <b>153,6</b>                             |
| <i>контрольные работы</i>                                                                                                                                                                   | 4                                        |
| <i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям и т.д.)</i> | 122,6                                    |
| <i>Подготовка к экзамену</i>                                                                                                                                                                | 27                                       |
| Вид промежуточного контроля:                                                                                                                                                                | экзамен                                  |

\*в том числе практической подготовки

**4.2 Содержание дисциплины**

Таблица 3

**Тематический план учебной дисциплины**

| Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)        | Всего      | Аудиторная работа, всего/* |             |            | Внеаудиторная работа СР |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------|
|                                                           |            | Л                          | ПЗ          | ПКР        |                         |
| Тема 1. Сущность управления проектами                     | 24         | 2                          | 2           |            | 20                      |
| Тема 2. Планирование проекта                              | 30         | 2                          | 4           |            | 24                      |
| Тема 3. Оценка проекта                                    | 32         | 2                          | 6/4         |            | 24                      |
| Тема 4. Основные подсистемы управления проектами          | 22         | 2                          |             |            | 20                      |
| Тема 5. Управление рисками проектов                       | 22         |                            | 2           |            | 20                      |
| Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами | 23         |                            | 2           |            | 21                      |
| Консультации перед экзаменом                              | 2          |                            |             | 2          |                         |
| КРА                                                       | 0,4        |                            |             | 0,4        |                         |
| <b>Всего за 3 семестр</b>                                 | <b>153</b> | <b>8</b>                   | <b>16/4</b> | <b>2,4</b> | <b>126,6</b>            |
| <i>Подготовка к экзамену</i>                              | 27         |                            |             |            | 27                      |
| <b>Итого по дисциплине</b>                                | <b>180</b> | <b>8</b>                   | <b>16/4</b> | <b>2,4</b> | <b>153,6</b>            |

\*в том числе практической подготовки

**Тема 1. Сущность управления проектами**

Проект и управление проектами. Концепция проектного цикла. Подсистемы и организационные структуры управления проектами. Команда проекта. Офис проекта.

## **Тема 2. Планирование проекта.**

Структурное планирование. Сетевой график. Критический путь проекта. Календарное планирование. Диаграмма Ганта. График загрузки ресурсов. Оперативное управление.

## **Тема 3. Оценка проекта.**

Оценка эффективности и реализуемости проектов. Источники финансирования проектов. Влияние использования заемных средств на показатели эффективности проектов.

## **Тема 4. Основные подсистемы управления проектами.**

Управление работами. Управление ресурсами. Управление стоимостью. Управление качеством. Управление закупками, торги и контракты.

## **Тема 5. Управление рисками проектов.**

Основные методы анализа рисков. Анализ чувствительности. Метод сценариев. Имитационное моделирование. Методы управления рисками. Страхование.

## **Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами.**

Обзор основных автоматизированных систем управления проектами. Microsoft Project.

### **4.3 Лекции и практические занятия**

Таблица 4

#### **Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия**

| № п/п | № раздела                                    | № и название лекций и практических занятий                             | Формируемые компетенции (индикаторы)             | Вид контрольного мероприятия  | Кол-во часов |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | <b>Тема 1. Сущность управления проектами</b> |                                                                        | <b>УК-2.1, УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3</b>    |                               | <b>4</b>     |
|       |                                              | Лекция № 1. Основные понятия управления проектами                      | УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3                   |                               | 2            |
|       |                                              | Практическая работа №1. Формирование команды проекта.                  | УК-2.3, УК-3.2, УК-3.3                           | работа в малых группах        | 2            |
| 2     | <b>Тема 2 Планирование проекта</b>           |                                                                        | <b>УК-2.1, УК-2.2</b>                            |                               | <b>6</b>     |
|       |                                              | Лекция №2 Планирование проекта                                         | УК-2.1, УК-2.2                                   |                               | 2            |
|       |                                              | Практическая работа №2. Применение методики структурного планирования  | УК-2.2                                           | выполнение группового задания | 1            |
|       |                                              | Практическая работа № 3. Применение методики календарного планирования | УК-2.2                                           | выполнение группового задания | 1            |
|       |                                              | Практическая работа № 4. Решение задач по методам планирования проекта | УК-2.2                                           | контрольная работа            | 2            |
| 3.    | <b>Тема 3. Оценка проекта</b>                |                                                                        | <b>УК-2.1, УК-2.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3</b> |                               | <b>8</b>     |
|       |                                              | Лекция №3. Оценка эффек-                                               | УК-2.1, УК-2.3,                                  |                               | 2            |

|    |                                                                  |                                                                                                                            |                                   |                                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
|    |                                                                  | тивности и реализуемости проекта                                                                                           | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3         |                                  |   |
|    |                                                                  | Практическая работа №5. Оценка эффективности и реализуемости проекта. Решение задач                                        | УК-2.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 | решение ситуационных задач       | 6 |
| 4. | <b>Тема 4. Основные подсистемы управления проектами</b>          |                                                                                                                            | <b>ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3</b>  |                                  | 2 |
|    |                                                                  | Лекция №4. Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта. Управление закупками. Управление качеством проекта | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3         |                                  | 2 |
| 5. | <b>Тема 5. Управление рисками проектов</b>                       |                                                                                                                            | <b>ОПК-4.3</b>                    |                                  | 2 |
|    |                                                                  | Практическая работа №6. Анализ чувствительности.                                                                           | ОПК-4.3                           | Проведение ситуационного анализа | 2 |
| 6. | <b>Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами</b> |                                                                                                                            | <b>УК-2.2</b>                     |                                  | 2 |
|    |                                                                  | Практическая работа № 7. Возможности автоматизированной системы MS Project                                                 | УК-2.2                            | выполнение группового задания    | 2 |

#### 4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

Таблица 5

##### Перечень вопросов для самостоятельного изучения

| № п/п | № раздела и темы                                          | Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема 1. Сущность управления проектами                     | Способы организации взаимодействия команды проекта. Программные средства для организации виртуального офиса проекта (УК-3.1)                      |
| 2.    | Тема 2. Планирование проекта                              | Методы выравнивания ресурсов (УК-2.2)                                                                                                             |
| 3.    | Тема 3. Оценка проекта                                    | Требования к структуре и содержанию, технико-экономических обоснований, бизнес-планов инвестиционных проектов, заявок на финансирование (ОПК-4.1) |
| 4.    | Тема 4. Основные подсистемы управления проектами          | Разработка тендерной документации (ОПК-4.1)                                                                                                       |
| 5.    | Тема 5. Управление рисками проектов                       | Диверсификация как способ снижения рисков. Резервирование средств (ОПК-4.3)                                                                       |
| 6.    | Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами | Формирование отчетов с помощью MS Project (УК-2.2)                                                                                                |

## 5. Образовательные технологии

Таблица 6

### Применение активных и интерактивных образовательных технологий

| № п/п | Тема и форма занятия                  | Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема 1. Сущность управления проектами | ПЗ                                                                            |
| 2.    | Тема 3. Оценка проекта                | ПЗ                                                                            |

## 6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

### 6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

1) Контрольные задания для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся

Представлены в оценочных материалах.

Пример варианта контрольной работы (Тема 2. Планирование проекта):

**Вариант 1**

#### Задание 1.

Для вычисления раннего времени начала работ используется формула (отметить все верные варианты):

☐  $T_{Pi}(i) = \min_{j \in G} (T_{Pi}(j) - T_P(j))$

☐  $T_{Pi}(i) = \min_{j \in H} (T_P(j) - t(j))$

☐  $T_{Pi}(i) = \max \begin{pmatrix} (T_P(1) + t_1) \\ (T_P(2) + t_2) \\ \dots \\ (T_P(n) + t_n) \end{pmatrix}$

☐  $T_{Pi}(i) = \max_{j \in G} (T_P(j) + t(j))$

☐  $T_{Pi}(i) = \max_{j \in G} (T_P(j) + T_{Pi}(j))$

☐  $T_{Pi}(i) = \min \begin{pmatrix} (T_{Pi}(1) - t_1) \\ (T_{Pi}(2) - t_2) \\ \dots \\ (T_{Pi}(n) - t_n) \end{pmatrix}$

#### Задание 2.

Составить сетевой график проекта по данным в таблице:

|                 |   |   |   |   |     |   |   |     |   |    |
|-----------------|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|
| Работа          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 |
| Предшественники | - | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 5 | 5 | 6,7 | 8 | 9  |


### Задание 3.

Найти критический путь проекта, используя данные таблицы и графика из задания 2, а также следующие длительности работ. Ответ подтвердить расчетами.

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Работа       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длительность | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0  |

### Задание 4.


Построить календарный график проекта, используя данные сетевого графика и таблицы. Датой начала проекта принять текущую дату. Ответ подтвердить расчетами. Рабочая неделя 5+2.



| Работа | Дней |
|--------|------|
| 1      | 0    |
| 2      | 1    |
| 3      | 2    |
| 4      | 3    |
| 5      | 0    |

### Задание 5.

Используя календарный график, построить график загрузки ресурсов для ресурса Р1.

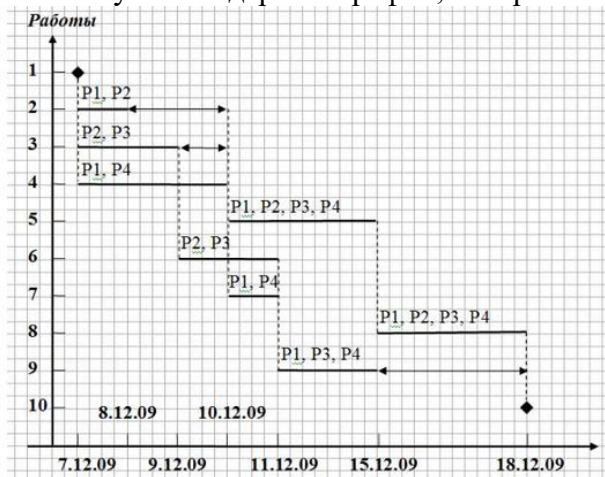

### Критерии оценки:

- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он правильно выполнил все задания контрольной работы.

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он в целом правильно, с небольшими недочетами выполнил все задания контрольной работы, или полностью правильно выполнил 80% заданий.

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он полностью правильно выполнил 60% заданий.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он правильно выполнил менее 60% заданий.

2) Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен):

1. Проект, свойства проекта. Результат проекта.
2. Управление проектами. Задачи управления проектами.
3. Концепция проектного цикла в управлении проектами.
4. Методика отбора проектов на начальных стадиях проектного цикла.
5. Команда проекта. Принципы формирования команды проекта.
6. Примерный состав команды проекта. Функции и роли в команде.
7. Офис проекта. Реальный и виртуальный офис.
8. Структурное планирование проекта. Этапы и задачи.
9. Сетевой график проекта: свойства, правила построения
10. Раннее время начала работы, позднее время начала работы, резерв времени. Сущность и способы определения.
11. Критическая работа. Критический путь проекта.
12. Календарное планирование проекта. Основные задачи.
13. Диаграмма Ганта – правила построения, применение.
14. График загрузки ресурсов – назначение, правила построения.
15. Методы выравнивания ресурсов.
16. Оперативное управление. Перепланирование проекта.
17. Оценка эффективности проекта. Основные принципы оценки.
18. Система показателей оценки эффективности проекта. Критерии оценки.
19. Оценка реализуемости проекта. Показатели финансовой реализуемости.
20. Управление финансированием проекта: основные схемы финансирования.
21. Подбор схемы финансирования проекта – основные принципы.
22. Особенности применения традиционной схемы при финансировании проектов.
23. Особенности применения схемы выплат равными суммами при финансировании проектов.
24. Особенности применения схемы по мере поступления средств от проекта при финансировании проектов.
25. Влияние применения заемных средств на эффективность проекта. Финансовый рычаг.
26. Управление стоимостью проекта на разных фазах проектного цикла.
27. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование.
28. Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема.
29. Работа. Свойства работы. Структура работы.
30. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Треугольник управления проектами.

31. Управление содержанием работ.
32. Принципы эффективного управления временем.
33. Управление ресурсами проекта. Цель и основные задачи.
34. Воспроизводимые и невозпроизводимые ресурсы. Особенности управления разными типами ресурсов.
35. Методы планирования ресурсов проекта.
36. Проверка ресурсной реализуемости календарного плана.
37. Управление закупками и поставками.
38. Управление запасами. Виды запасов
39. Затраты на содержание запасов: пространство, рента, стоимость риска.
40. Управление качеством проекта. Аспекты качества.
41. Планирование качества. Обеспечение качества.
42. Контроль качества. Методы контроля качества.
43. Организация закупок. Конкурентные способы определения поставщиков.
44. Конкурсы. Виды, особенности проведения.
45. Аукционы. Виды, особенности проведения.
46. Запрос котировок. Особенности проведения
47. Запрос предложений. Особенности проведения
48. Методы оценки рисков проекта.
49. Анализ чувствительности. Матрица результатов анализа чувствительности
50. Метод сценариев, особенности проведения.
51. Имитационное моделирование. Сущность, входная информация, анализ результатов.
52. Управление рисками проекта.
53. Применение страхования в управлении рисками проекта.
54. Особенности сельскохозяйственного страхования с господдержкой.
55. Применение автоматизированных систем управления проектами.
56. Основные возможности автоматизированной системы MS Project.
57. Сетевое планирование проекта в MS Project/
58. Календарное планирование проекта в MS Project/
59. Назначение ресурсов работам в MS Project. Типы ресурсов, характеристики ресурсов.
60. Выравнивание ресурсов в MS Project. Ручное и автоматическое выравнивание ресурсов.

## **6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания**

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успеваемости студентов.

Контроль освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена.

## Критерии оценивания результатов обучения (экзамен)

Таблица 7

| Оценка                                           | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокий уровень<br>«5»<br>(отлично)              | оценку <b>«отлично»</b> заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.<br><b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – высокий.</b> |
| Средний уровень<br>«4»<br>(хорошо)               | оценку <b>«хорошо»</b> заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.<br><b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – хороший (средний).</b>                                                    |
| Пороговый уровень<br>«3» (удовлетворительно)     | оценку <b>«удовлетворительно»</b> заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.<br><b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный.</b>    |
| Минимальный уровень<br>«2» (неудовлетворительно) | оценку <b>«неудовлетворительно»</b> заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.<br><b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</b>                                                                                                                      |

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1 Основная литература

1. Алексанов, Д. С. Управление проектами в АПК : учебник для вузов / Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Н. В. Чекмарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15176-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568240> .
2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560386>.

### 7.2 Дополнительная литература

3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. —  
URL: <https://urait.ru/bcode/560561>.

4. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебник для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/562209>.
5. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21476-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/581725>.

### 7.3 Нормативные правовые акты

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224#0>.

## 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://elib.timacad.ru> Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (открытый доступ).
2. <https://urait.ru> Образовательная платформа Юрайт (открытый доступ).

## 9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Таблица 10

Перечень программного обеспечения

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины | Наименование программы | Тип программы                                        | Автор     | Год разработки |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1     | Тема 1. Сущность управления проектами   | WORD                   | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983           |
|       |                                         | POWER POINT            | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987           |
|       |                                         | EXCEL                  | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984           |
| 2     | Тема 2. Планирование проекта            | WORD                   | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983           |
|       |                                         | POWER POINT            | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987           |
|       |                                         | EXCEL                  | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984           |
| 3     | Тема 3. Оценка проекта                  | WORD                   | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983           |
|       |                                         | POWER POINT            | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987           |
|       |                                         | EXCEL                  | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984           |
| 4     | Тема 4. Основные                        | WORD                   | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983           |

|   |                                                           |             |                                                      |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|------|
|   | подсистемы управления проектами                           | POWER POINT | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987 |
|   |                                                           | EXCEL       | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984 |
| 5 | Тема 5. Управление рисками проектов                       | WORD        | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983 |
|   |                                                           | POWER POINT | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987 |
|   |                                                           | EXCEL       | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984 |
| 6 | Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами | WORD        | текстовый процессор                                  | Microsoft | 1983 |
|   |                                                           | POWER POINT | система по созданию красочных, наглядных презентаций | Microsoft | 1987 |
|   |                                                           | EXCEL       | табличный процессор                                  | Microsoft | 1984 |
|   |                                                           | PROJECT     | автоматизированная система управления проектами      | Microsoft | 2007 |

## 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Таблица 10

### Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лабораториями

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы (№ учебного корпуса, № аудитории)                                                                                                          | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации<br>№ 1 (Лиственничная аллея, 2 а), № 502 | 1. Проектор – 1 шт. (Инв. № 35203)<br>2. Моноблок 2-х местный без спинки -14 шт.(Инв. № 560939)<br>Моноблок 2-х местный со спинкой - 4 шт.(Инв. № 560940)<br>3. Стол двухместный 1 шт. (Инв. № 332088)<br>4. Доска белая– 1 шт. (Инв. № 332050)<br>5. Экран портативный на штативе - 1 шт. (Инв. № 332049)<br>6.. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. № 332078) |
| учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации<br>№ 1 (Лиственничная аллея, 2 а), № 512                                | 1. Системный блок - 20 шт. (Инв. № 558788) с монитором – 20 шт. (Инв. № 554211)<br>2. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв. № 332054)<br>3. Доска магнитная белая– 1 шт. (Инв. № 332050)<br>4. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. № 332078)<br>5. Компьютерный стол – 20 шт.( Инв. № 332086)                                                                            |
| Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова (Лиственничная аллея, д.2.к.1)                                                                                                                                   | Читальный зал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины**

Необходимым условием эффективной работы студентов на практических занятиях по дисциплине Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» является изучение необходимого теоретического материала. При изучении каждого раздела дисциплины проводится контроль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического материала и практических умений и навыков. Контроль знаний проводится по графику в часы практических занятий по основному расписанию. Студент обязан отчитаться по всем учебным разделам дисциплины; к промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие все задания, предусмотренные программой.

Выполнение большинства практических и домашних заданий потребует от студента самостоятельного поиска информации по теме изучения.

### *Методические рекомендации к практическим занятиям*

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную и дополнительную литературу, рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

В ходе занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия: вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

### *Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента*

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с настоящей рабочей программой. Студент обязан в полном объеме использовать предусмотренное время для изучения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение.

Во время самостоятельной работы студент прорабатывает материал обязательной и дополнительной учебной литературы. В случае возникновения затруднений в освоении материала студент обращается к преподавателю за разъяснением во время, отведенное для индивидуальных консультаций.

### *Подготовка к контрольным мероприятиям*

Текущий контроль проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и методы текущего контроля: выполнение групповых заданий, выполнение индивидуальных заданий, решение задач, контрольная работа.

### **Виды и формы отработки пропущенных занятий**

Задолженности по текущему и промежуточному контролю можно сдавать в период, установленный правилами вуза и соответствующими распоряжениями компетентных лиц:

*По посещению* – путем самостоятельного изучения вопросов и выполнения тестовых заданий по пропущенной теме.

*По выполнению контрольных заданий* – путем написания и защиты соответствующих контрольных заданий по мере их готовности.

Студент, пропустивший занятия обязан получить от преподавателя индивидуальное задание, предусмотренное учебным планом, выполнить и защитить его. Прием и защита индивидуальных заданий проводятся в часы и дни, установленные преподавателем.

Если студент не прошел текущий контроль, он продолжает учиться и имеет право проходить следующий текущий контроль по этой дисциплине. Графики пересдач составляются на кафедре. В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения принимается решение о допуске студента к промежуточной аттестации или освобождении от нее.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие все задания, предусмотренные программой. Если студент имеет задолженности по текущему контролю, то до промежуточной аттестации студент не допускается и считается задолжником по этой дисциплине.

## **12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине**

При разработке рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» могут быть сформированы различные варианты тематических планов лекций и форм их проведения. При этом должна обеспечиваться координация, согласованность этих видов занятий, разграничение рассматриваемых на них вопросов. Некоторые вопросы по усмотрению автора рабочей программы в зависимости от методического обеспечения учебного процесса сгруппированы в укрупненные темы, использованы для формулировки

тем дискуссий, тематических лекций. Тематика может корректироваться, уточняться.

В лекциях рассматриваются только те вопросы, которые не выносятся на самостоятельное изучение. Определенная часть времени лекции выделяется на то, чтобы сориентировать студентов в использовании рекомендуемой литературы и других элементов учебно-методического комплекса, предоставляемых в их распоряжение. Детально рассматриваются основные термины и категории, что позволяет студентам освоить профессиональную терминологию и легко адаптироваться к реальным условиям производственной, научной и образовательной деятельности.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования различных видов оценочных материалов. Устные опросы целесообразно проводить во время практических занятий, а также при проведении экзамена в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы.

Решение ситуационных заданий осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента по решению практической ситуационной управленческой задачи.

Задания, требующие изучения значительного объема материала, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременно разбором результатов во время практических занятий. Решение ситуационных заданий с глубоким обоснованием представляются на проверку в письменном виде.

При оценке решения ситуационного задания анализируется понимание студентом конкретной ситуации, правильность выбора документов, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки теоретического материала.

### **Программу разработали:**

Чекмарева Н.В., к.э.н., доцент

  
(подпись)

**РЕЦЕНЗИЯ**  
**на рабочую программу дисциплины**  
**Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве»**  
**ОПОП ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия»,**  
**направленность «Управление агробизнесом в растениеводстве»**  
**(квалификация выпускника – магистр)**

Ашмариной Татьяной Игоревной, доцентом кафедры экономики и организации производства, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», к.э.н. (далее по тексту рецензент), проведено рецензирование рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» ОПОП ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия», направленности «Управление агробизнесом в растениеводстве» (квалификация выпускника – магистр) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре управления (разработчик – Чекмарева Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления).

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия». Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нормативно-методическим документам.

2. Представленная в Программе **актуальность** учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1.В.

3. Представленные в Программе **цели** дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО направления 35.04.04 «Агрономия».

4. В соответствии с Программой за дисциплиной Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» закреплено **6 компетенций (девять индикаторов)**. Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения заявленных результатов.

5. Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» составляет 5 зачётных единиц (180 часов).

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.04.04 «Агрономия» и возможность дублирования в содержании отсутствует.

7. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

8. Программа дисциплины «Управление проектами в растениеводстве» предполагает занятия в интерактивной форме.

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС ВО направления 35.04.04 «Агрономия».

10. Представленные и описанные в Программе формы *текущей* оценки знаний (как в форме выполнения групповых заданий, решения задач, так и контрольные работы), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, осуществляется в форме экзамена, что соответствует статусу дисциплины, как дисциплины вариативной части учебного цикла – Б1.В ФГОС ВО направления 38.04.01 «Экономика».

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литературой – 2 источника (базовые учебники), дополнительной литературой – 3 наименования, Интернет-ресурсы – 2 источника и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 35.04.04 – «Агрономия».

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

14. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения по дисциплине Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве».

### **ОБЩИЕ ВЫВОДЫ**

На основании проведенного рецензирования можно сделать заключение, что характер, структура и содержание рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» ОПОП ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия», направленность «Управление агробизнесом в растениеводстве» (квалификация выпускника – магистр), разработанная Чекмаревой Натальей Вячеславовной, доцентом кафедры управления, к.э.н., соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.

Рецензент: Ашмарина Т.И.,

доцент кафедры экономики и организации производства, к.э.н.



«26» августа 2025 г.
